Consubanco

Nueva App Inversiones

Plan de Ikitech al **19 oct 2026** · ClickUp al 3 nov
Sprint 2 Q4 (Sprint 4 de Ikitech) · 26 oct – 16 nov

Cuenta Digital N4 y Rocket

Construir junto con Ikitech la nueva app de Consubanco para abrir la Cuenta Digital N4 y las cuentas de inversión para menores de edad de Rocket, con fin de desarrollo planeado para el 25 de diciembre de 2026.

52
días para el fin de desarrollo
25 de diciembre de 2026

Línea base de 18 semanas, del 24 de agosto al 25 de diciembre. Estamos en la semana 2 del Sprint 2 Q4 de ClickUp (26 de octubre al 16 de noviembre), que en el plan de Ikitech corresponde al Sprint 4.



Habilitadores del banco

Entregables de Consubanco que permiten a Ikitech sostener las fechas del plan.

CSB-DEP-01 · En desarrollo

Nuevas APIs de enrolamiento

Responsable: Raúl Uribe (CSB) · **50%**

Servicios para la apertura y el enrolamiento desde cero. Ya se entregaron las credenciales del ambiente de desarrollo y se preparó la entrega del código para el ambiente del banco (20 oct).

Siguiente paso: Publicar las APIs en el ambiente de QA.

CSB-DEP-02 · Requiere atención

Definiciones de Rocket

Responsable: POs de negocio · **50%**

Ya se capturaron en ClickUp las HUs de naves, misiones, movimientos y perfil. Faltan las respuestas a las dudas del 30 de septiembre, 7 y 13 de octubre.

Siguiente paso: Refinar con Ikitech las HUs nuevas de Rocket.

CSB-DEP-03 · Requiere atención

Ambientes en la nube (GCP)

Responsable: Equipo de Cloud CSB · **50%**

Cloud Run, PostgreSQL 17, Secret Manager y certificado SSL para el ambiente de QA.

Siguiente paso: Entregar URLs, secretos y certificado del ambiente de QA.

Avance por proyecto

Avance real reportado por Ikitech al 19 de octubre, por componente técnico y su peso en cada proyecto.

Proyecto 1: Nueva App Inversiones (N4)

Peso 50% del programa · En progreso

36.5%

COMPONENTE	PESO	AVANCE
Front de los journeys N4 React 19 / Vite	20%	**95%**
Textos y recursos dinámicos Server-Driven UI vía CDN	10%	**100%**
Integración con Incode Selfie, INE y prueba de vida	20%	**80%**
APIs del banco Core, RENAPO y Secoban	20%	**15%**
Dashboard y movimientos Sprint 4	10%	Programado
Simulador de inversiones Sprint 4	10%	Programado
Aclaraciones con Salesforce Sprint 5	5%	Programado
Estados de cuenta y constancias Sprint 6	5%	Programado

Proyecto 2: Ecosistema Rocket

Peso 50% del programa · Requiere atención

42%

COMPONENTE	PESO	AVANCE
Front del tutor Onboarding y Home “Mi Tripulación”	25%	**85%**
Consola del menor en CDN Server-Driven UI, temas Espacio y Océano	15%	**100%**
Integración con Incode Re-KYC del tutor y biometría	30%	**90%**
APIs Core ICBS y Salesforce Integración y QA	30%	**10%**
Naves y Misiones Gamificación · Sprints 4 y 5	—	Programado

Puntos de atención

Ambiente de QA en la nube — Requiere atención

El front de N4 y Rocket ya recorre el flujo completo con datos de prueba, y los servicios avanzan en desarrollo: esta semana se integraron el endpoint base, la geolocalización, el consentimiento de INE y la revisión del teléfono en listas de riesgo. El siguiente paso es conectar front y servicios en un ambiente estable del banco: el equipo de Cloud debe habilitar QA en GCP (URLs, secretos y certificado SSL) y el equipo de Juan David Agudelo, confirmar la disponibilidad de los servicios para pruebas. Con eso se confirma el Hito 1 y arrancan las pruebas de punta a punta rumbo a la meta del 15 de noviembre.

Definiciones de Rocket — Requiere atención

Buen avance: ya están en ClickUp las HUs de naves de ahorro, misiones, movimientos, detalle de cuenta, perfil y notificaciones, y el grooming del 29 de octubre dejó identificadas las definiciones por cerrar: cómo entra y sale el dinero de la cuenta del menor cuando el tutor no tiene N4, el RFC y régimen fiscal a capturar, los límites de cuentas por tutor y de naves, las reglas de validación del acta de nacimiento y el cuestionario KYC propio de Rocket. Ikitech estima un ajuste de 1 a 1.5 sprints si estas definiciones no se cierran a tiempo.

Front listo, back en marcha — Foco del sprint

El front de N4 va al 95% y, en ClickUp, 19 de las 26 HUs en desarrollo ya tienen las pantallas terminadas. El enfoque del sprint es el back: conectar esas pantallas con los servicios de Consubanco y los cuestionarios de Rocket.

Actualización de Incode — En marcha


La lectura de la INE y la selfie con Incode ya están integradas (29 de octubre), con la configuración para N4 y Rocket lista desde el 20 de octubre. El siguiente paso es la lectura del acta de nacimiento: se revisa con el equipo de Juan David Agudelo y, en paralelo, se prepara una alternativa técnica. La integración va al 80% en N4 y al 90% en Rocket.

Rocket suma HUs completadas — Listo

El 26 de octubre se completaron el Home de la cuenta Rocket, la generación de accesos a la consola desde la app y “Mi Tripulación” (HU0043 a 0045). La activación de la cuenta del menor con enlace o código ya está en desarrollo.

Roadmap del proyecto

Master gantt de Ikitech: 21 semanas, del Sprint 0 de preparación (3 de agosto) al fin de desarrollo (25 de diciembre de 2026). La semana actual es la W14 (2 al 6 de noviembre).

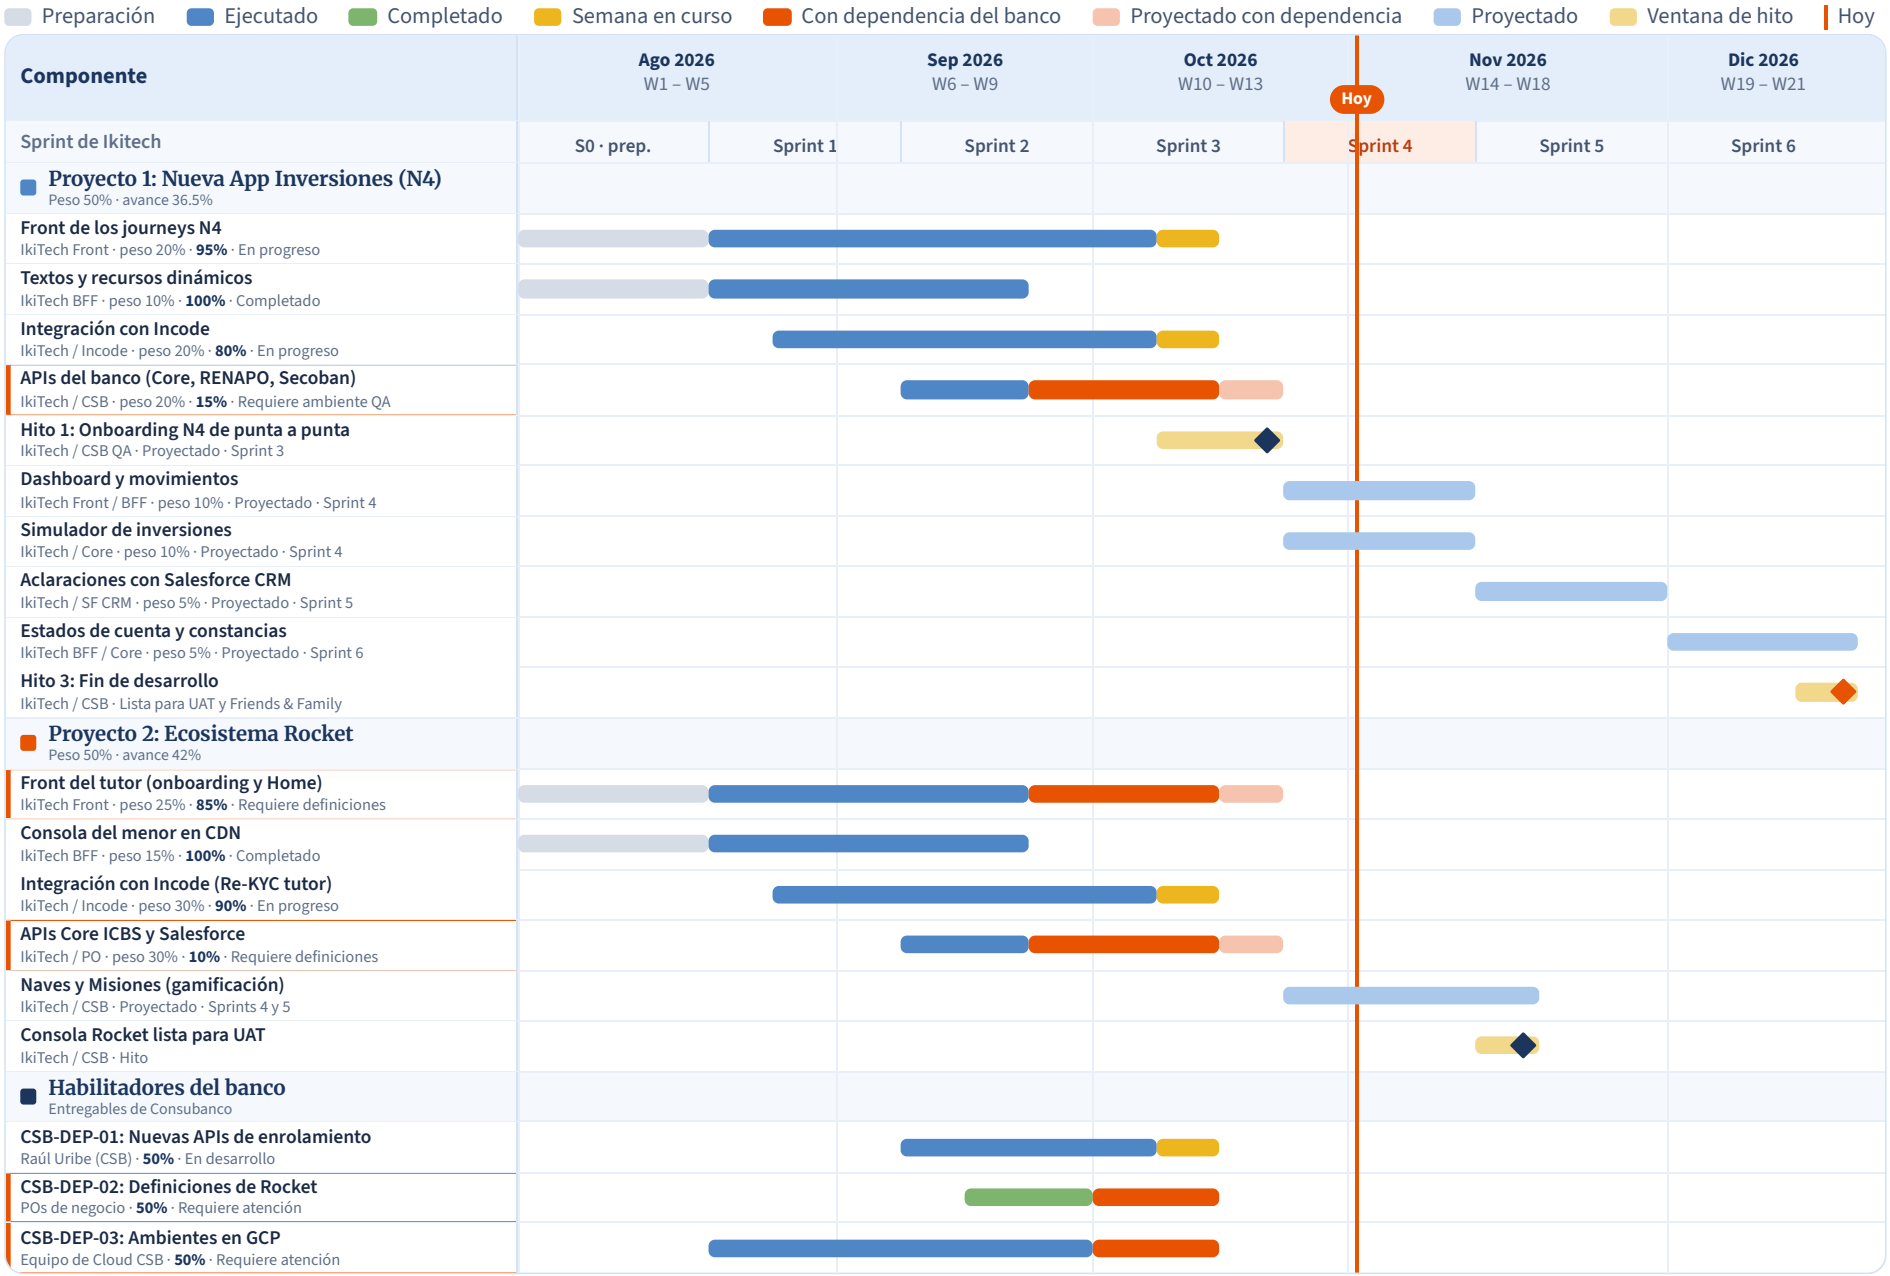

Hitos del plan

11 sep 2026 · realizado
Cierre del Sprint 1
Contenedor Flutter y PWA listos; inicio del mapeo de APIs

2 oct 2026 · realizado
Cierre del Sprint 2
Review aprobado al 100% con reconocimiento a la calidad visual

23 oct 2026 · realizado
Hito 1: Onboarding N4
Enrolamiento N4 de punta a punta (Sprint 3); pases a QA con dependencia del ambiente en la nube

13 nov 2026
Hito 2: Simulador y Consola Rocket
Simulador de inversiones y consola web del menor (Sprint 4)

4 dic 2026
Prueba de desempeño
500 solicitudes por segundo con respuesta p95 de 900 ms o menos (Sprint 5)

25 dic 2026
Hito 3: Fin de desarrollo
App lista para UAT y Friends & Family (Sprint 6)

Plan por sprint

Alcance de cada sprint de Ikitech y su equivalente en ClickUp.


Sprint	ClickUp	Nueva App Inversiones (N4)	Ecosistema Rocket	Hito
Sprint 0 3 – 21 ago	Pre-fase	• Base de la app en Flutter y documento de arquitectura (SAD v3.0) • Diseño UI/UX en Figma y maquetación de pantallas básicas	• Maquetación inicial del onboarding y landings con datos de prueba	● Completado Preparación (no suma al avance)
Sprint 1 24 ago – 11 sep	SP3-Q3	• Migración a React 19 / Vite y contenedor Flutter • Pruebas de concepto y pruebas con API Connect	• Onboarding de Rocket migrado a React 19 • Datos de prueba	● Completado Contenedor y PWA cerrados; inicio del mapeo de APIs
Sprint 2 14 sep – 2 oct	SP4-Q3	• Enrolamiento desde cero (PWA al 85%) • Integración con Incode (40%) • Análisis de APIs con Raúl Uribe	• Onboarding de Rocket (70%) • Biometría con Incode (30%) • Mesa de trabajo de 5 vacíos	● Completado Review aprobado al 100%
Sprint 3 5 – 23 oct	SP1-Q4	• Bienvenida y enrolamiento N4 de punta a punta • Inicio de sesión con CURP y bloqueos (AD y CRM) • Temporizador del código SMS (90 s), Incode 2.0 y ruta alterna Karalundi	• Varios menores por tutor: “Mi Tripulación” • Regla SPEI en el Core ICBS y parentesco • Consola web del menor en CDN	● Completado Hito 1: Onboarding N4; pases a QA con dependencia del ambiente en la nube
Sprint 4 26 oct – 13 nov	SP2-Q4	• Simulador de inversiones interactivo con tasas del Core ICBS • Dashboard con saldo que se puede ocultar	• Consola web del menor en la nube (React 19) • Temas Espacio y Océano; Naves	● En curso Hito 2: Simulador y Consola Rocket
Sprint 5 16 nov – 4 dic	SP3-Q4	• Aclaraciones integradas con Salesforce CRM • Pruebas de carga: 500 solicitudes por segundo (p95 ≤ 900 ms)	• Conexión con el Core ICBS para Misiones y Naves de ahorro con recompensas	● Programado Prueba de desempeño y carga en GCP
Sprint 6 7 – 25 dic	SP4-Q4	• Firma de contratos con Incode (NOM-151) • Regresión automatizada sin errores	• Fin de desarrollo; lista para UAT y Friends & Family	● Programado Hito 3: Fin de desarrollo

Avance por historia de usuario

Avance funcional por HU con datos de ClickUp al 3 de noviembre. Complementa el avance técnico por componente que reporta Ikitech.

Resumen de avance

21%
avance general



HUs completadas · Front terminado · Back terminado

41%
avance promedio de las 26 HUs en desarrollo

19 de 26
HUs en desarrollo con el front terminado

30% · 12%
front · back terminados en todo el alcance

12 completadas | **26** en desarrollo | **17** refinadas | **41** por refinar | **12** en backlog

Cómo se mide. Cada HU en desarrollo se divide en dos partes del mismo peso: **front** (pantallas, 50%) y **back** (servicios e integración, 50%). Solo suma lo terminado. Una HU completada cuenta 100% y una por iniciar, 0%.

Cómo leer este avance

Avance técnico (Ikitech)

Mide cada componente de la solución (front, servicios, Incode, APIs del banco) según su peso en el proyecto. Es la cifra oficial del plan: Nueva App Inversiones al 36.5% y Ecosistema Rocket al 42%.

Avance por HU (ClickUp)

Mide cuántas historias de usuario del alcance completo ya están terminadas, incluidas las que aún no inician. Por eso avanza más lento al principio, baja cuando entran HUs nuevas al alcance y acelera cuando se conecta el back.

Siguiente salto

Al cerrar el back de las 26 HUs en desarrollo, el avance por HU pasa de 21% a 35%. Por eso el ambiente de QA y las APIs del banco son clave en este sprint.

Avance por épica



Experiencia — 100%

Completadas 7/7

Onboarding — 39%

Completadas 1/7 · Front listo 3/3 · Back listo 0/3 · Por iniciar: 1 por refinar · 2 en backlog

Inicio de sesión — 0%

Por iniciar: refinadas 7 · por refinar 0 · backlog 0

Cuenta Digital N4 — 23%

Completadas 1/16 · Front listo 4/7 · Back listo 0/7 · Por iniciar: 2 refinadas · 1 por refinar · 5 en backlog

Rocket — 31%

Completadas 0/20 · Front listo 12/14 · Back listo 0/14 · Por iniciar: 5 refinadas · 1 en backlog

Manejo cuenta Rocket — 17%

Completadas 3/18 · Por iniciar: 12 por refinar · 3 en backlog

Consola Rocket — 0%

Completadas 0/28 · Front listo 0/2 · Back listo 0/2 · Por iniciar: 3 refinadas · 22 por refinar · 1 en backlog

Cimentación técnica — 0%

Por iniciar: refinadas 0 · por refinar 5 · backlog 0

Sprint 2 Q4 · Sprint 4 de Ikitech


Alcance comprometido por Ikitech

Nueva App Inversiones (N4)

- Servicios de bienvenida, contacto, INE y domicilio
- Revisión del teléfono en listas de riesgo (integrada el 29 oct)
- Documentos de contratación y firma
- Simulador de inversiones con tasas del Core ICBS
- Dashboard con saldo que se puede ocultar

Ecosistema Rocket

- Home, accesos a la consola y “Mi Tripulación” (completadas el 26 oct)
- Servicios de la apertura: cuestionarios PLD, domicilio y acta de nacimiento
- Activación de la cuenta del menor con enlace o código
- Consola web del menor en la nube (React 19), temas Espacio y Océano

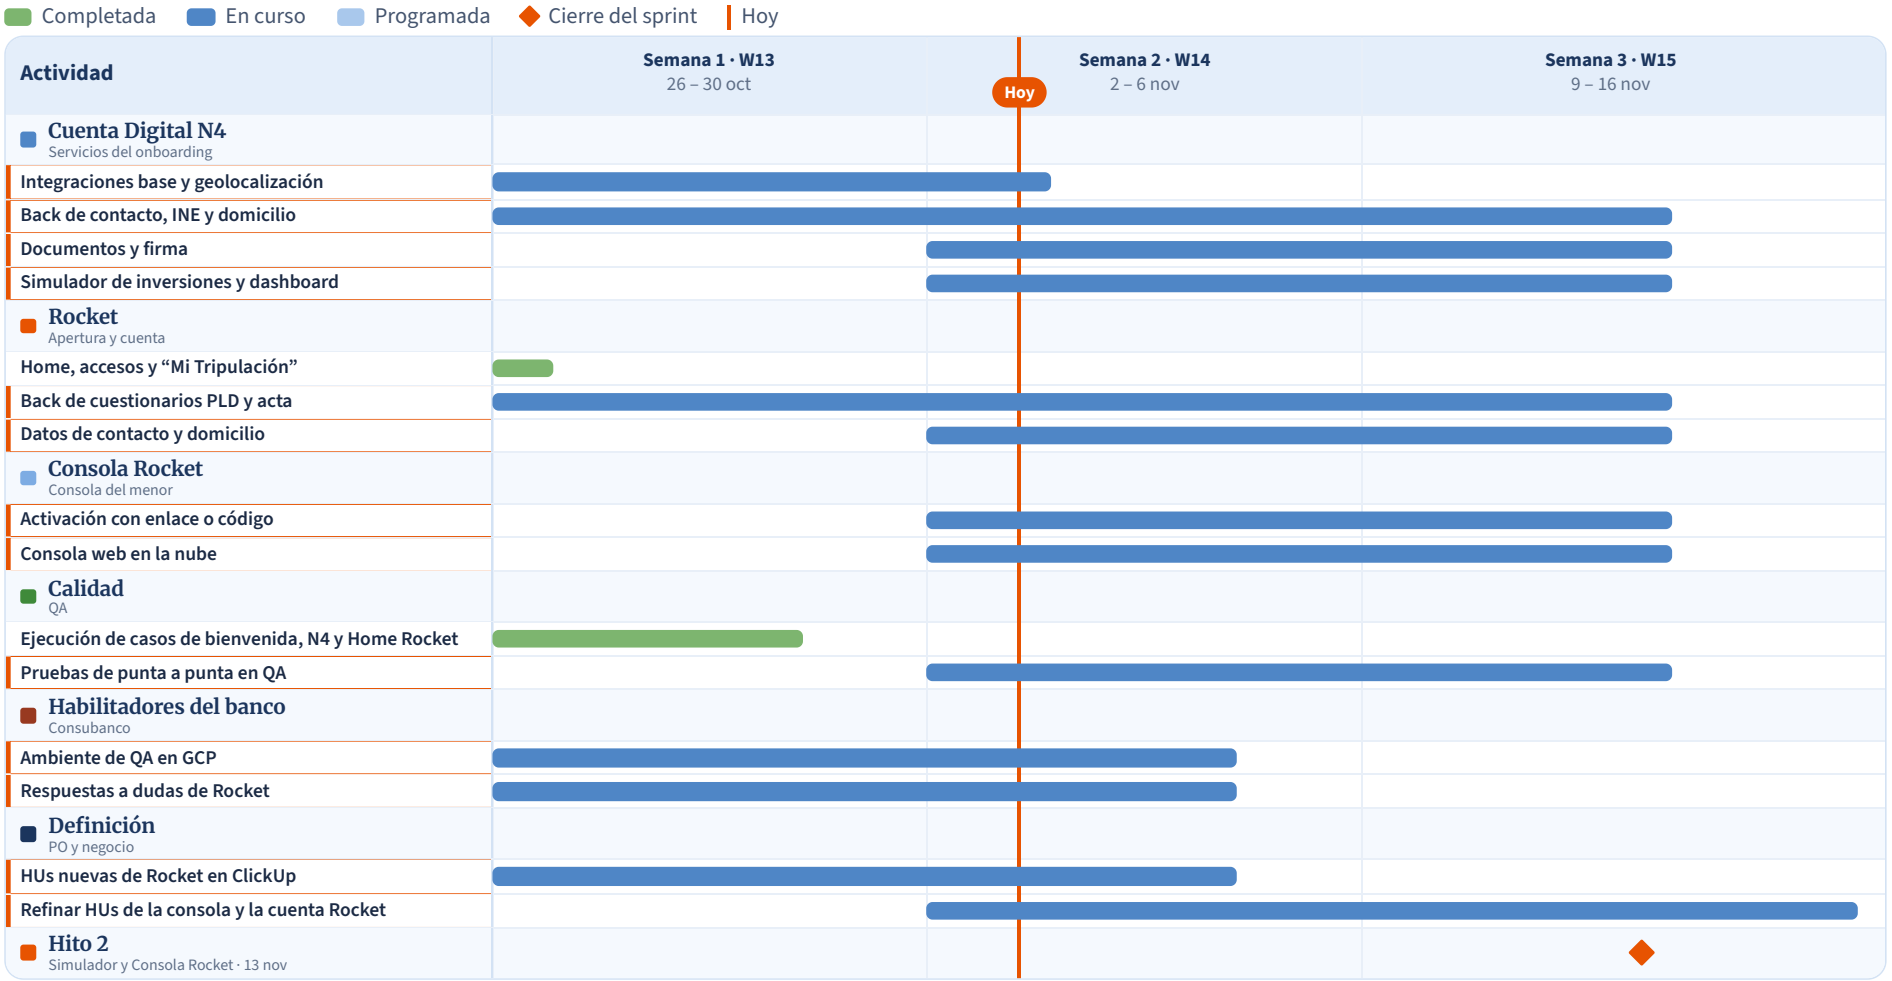

Hitos del sprint

26 oct 2026 · realizado
Arranque del Sprint 2 Q4
Home de Rocket, accesos y “Mi Tripulación” completadas

29 oct 2026 · realizado
Revisión del teléfono integrada
N4 y Rocket

13 nov 2026
Hito 2
Simulador de inversiones y Consola Rocket

16 nov 2026
Arranque del Sprint 3 Q4
Aclaraciones con Salesforce y pruebas de carga

Entregado y equipo

Entregado

- **3 nov** — Endpoint base, geolocalización y consentimiento de INE integrados en N4; servicio de términos y condiciones integrado y ajustes visuales del Home
  - N4 servicios — 3 nov
- **29 oct** — Revisión del teléfono en listas de riesgo integrada en N4 y en Rocket
  - N4 y Rocket — 29 oct
- **26 oct** — HU0043 a HU0045 completadas: Home de la cuenta Rocket, generación de accesos a la consola y “Mi Tripulación”; geolocalización integrada en la apertura
  - Rocket — 26 oct
- **25 oct** — 18 casos de prueba ejecutados: 8 del Home de Rocket y 10 de bienvenida, contacto y código SMS de N4
  - Calidad — 25 oct
- **23 oct** — Pantallas y avisos de validación en listas de control de N4; 6 casos de prueba de bienvenida ejecutados; mejora de identificadores de accesibilidad
  - N4 — 22 – 23 oct
- **20 oct** — Mapeo de integraciones, catálogo genérico, migración de tablas y certificado para el ambiente del banco; configuración de Incode para N4 y Rocket
  - Servicios — 20 oct
- **14 oct** — Front del acta de nacimiento del menor terminado (HU0038) y nueva versión del SDK de Incode
  - Rocket — 14 oct
- **7 oct** — HU_N4_003 completada: validación del código SMS; términos y condiciones y servicio de revisión del teléfono en listas de riesgo
  - N4 — 2 – 7 oct
- **7 oct** — Pantallas de domicilio y datos de la INE; front de los cuestionarios de Rocket terminado
  - N4 y Rocket — 2 – 7 oct
- **2 oct** — Cierre del Sprint 2 con review aprobado al 100% y reconocimiento a la calidad visual de las pantallas (pixel-perfect)
  - Sprint — 2 oct
- **2 oct** — Las 7 HUs de experiencia completadas: principios, accesibilidad, sistema de diseño, estados, nativo + PWA y navegación
  - Experiencia — 2 oct
- **1 oct** — Conexión con Incode para validar identidad, retomar el flujo si se interrumpe, lectura automática de la INE y envío del código SMS
  - N4 servicios — 1 oct
- **30 sep** — Firma electrónica, acta de nacimiento del menor, ocupación, origen de recursos, PEP, saldo promedio y atención asistida
  - Rocket — 28 – 30 sep
- **30 sep** — Pantalla de carga unificada, memoria de datos entre pantallas y navegación de regreso en N4
  - App — 28 – 30 sep
- **25 sep** — Textos y recursos visuales dinámicos al 100% (Server-Driven UI): se actualizan desde la nube sin publicar otra versión; temas Espacio y Océano de la consola del menor
  - N4 y Rocket — Sep
- **23 sep** — Primeros 5 casos de prueba ejecutados (bienvenida)
  - Calidad — 23 sep
- **11 sep** — Cierre del Sprint 1: contenedor Flutter y PWA listos; inicio del mapeo de APIs
  - Sprint — 11 sep
- **11 sep** — Base de la app en Flutter conectada con los flujos en React; pruebas de concepto de tecnología, concurrencia, Incode y sistema de diseño
  - Arquitectura — 1 – 11 sep
- **11 sep** — Manejo de sesión segura y servicios de contenidos administrables
  - Servicios — 1 – 11 sep
- **11 sep** — Pantallas de código SMS, contrato, correo, contraseña, confirmación, información fiscal, límite diario y cuestionario financiero
  - N4 y Rocket — 1 – 11 sep
- **25 ago** — HU_AC_001 Acceso a la plataforma y permisos: primera HU completa
  - Onboarding — 25 ago
- **21 ago** — Splash, permisos nativos (notificaciones y ubicación), carrusel de beneficios y pantalla de acceso con las 3 opciones
  - Onboarding — 20 – 21 ago
- **21 ago** — Bienvenida, requisitos, beneficios, términos y aviso de privacidad con consentimiento, fecha, hora y geolocalización; visor de PDF
  - N4 — 20 – 21 ago
- **21 ago** — Componentes de formulario, alertas y estilos compartidos
  - Base — 20 – 21 ago

Actividades del equipo

Front y base de la app
Dev05

Entregado

Rocket: cuestionarios PLD, firma, acta de nacimiento; “Mi Tripulación” y detalle de cada menor (26 oct); términos y condiciones y ajustes del Home (3 nov)

En curso

Rocket: documentación y firma (HU0040)

Front
Dev02

Entregado

Home de la cuenta Rocket y generación de accesos a la consola (26 oct); pantallas de domicilio y datos de la INE

En curso

N4 datos de contacto (HU_N4_002); Rocket datos de contacto (HU0025)

Servicios e integraciones
Dev04

Entregado

Configuración de Incode para N4 y Rocket (20 oct); geolocalización en Rocket (26 oct); mapeo de integraciones de Rocket (3 nov)

En curso

Back de Rocket y cuestionarios; lectura de la INE con Incode

Servicios y contenidos
Dev03

Entregado

Revisión del teléfono en listas de riesgo en N4 y Rocket (29 oct); mapeo de integraciones, catálogo genérico y certificado (20 oct)

En curso

Integraciones de N4 con el ambiente del banco

Calidad (QA) y servicios
Dev01

Entregado

24 casos de prueba ejecutados (22–25 oct); endpoint base, geolocalización y consentimiento de INE en N4 (3 nov)

En curso

Servicios de Rocket; pruebas al habilitarse QA

Detalle por historia de usuario

Etapa y avance de cada HU. El avance considera front y back con el mismo peso.

HU	Nombre	Épica	Etapa	Avance	Equipo	Comentario
EXP-001	Principios rectores de la experiencia	Experiencia	Completada	**100%** · Completada		Completada el 2 oct
EXP-002	Principios UX de implementación	Experiencia	Completada	**100%** · Completada		Completada el 2 oct
EXP-003	Accesibilidad	Experiencia	Completada	**100%** · Completada		Completada el 2 oct
EXP-004	Sistema de diseño y design tokens	Experiencia	Completada	**100%** · Completada		Base técnica de design tokens entregada
EXP-005	Gestión de estados	Experiencia	Completada	**100%** · Completada		Completada el 2 oct
EXP-006	Experiencia continua (nativo + PWA)	Experiencia	Completada	**100%** · Completada		Completada el 2 oct
EXP-007	Arquitectura de información y navegación	Experiencia	Completada	**100%** · Completada		Completada el 2 oct
HU_AC_001	Acceso a la plataforma y permisos	Onboarding	Completada	**100%** · Completada	Dev05	Entregada el 25 ago
HU_AC_002	Bienvenida a la aplicación (beneficios)	Onboarding	En progreso	**75%** · Front listo · Back en curso	Dev05 · Dev03	Front listo; integración de contenidos en curso
HU_AC_003	Inicio de sesión (acceso directo)	Onboarding	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev02 · Dev04	Integración con servicio Consubanco en curso
HU_AC_004	Autenticación biométrica	Onboarding	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente		
HU_AC_005	Gestión de sesión	Onboarding	Por refinar	—	Dev02 · Dev04	Se reprograma; el manejo de sesión segura ya está entregado
HU012	Acceso recurrente	Onboarding	En backlog	—		
—	Manejo de acceso y excepciones	Onboarding	En backlog	—		
HU_AC_006	Pantalla de bienvenida y ruteo inicial	Inicio de sesión	Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_007	Login: teléfono, contraseña y dispositivo	Inicio de sesión	Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_008	Bloqueos en inicio de sesión (AD y CRM)	Inicio de sesión	Refinada, por iniciar	—		

HU	Nombre	Épica	Etapa	Avance	Equipo	Comentario
HU_AC_009	Recuperar contraseña	Inicio de sesión	Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_010	Migración de cliente existente vía CURP	Inicio de sesión	Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_011	Registro nuevo — verificación de productos	Inicio de sesión	Refinada, por iniciar	—		
HU_AC_012	Enrolamiento cliente con productos	Inicio de sesión	Refinada, por iniciar	—		
HU_N4_001	Bienvenida y beneficios apertura	Cuenta Digital N4	En progreso	**0%** · Front en curso · Back pendiente	Dev05 · Dev03	Front y contenidos listos; integración en curso
HU_N4_002	Captura de datos de contacto	Cuenta Digital N4	En progreso	**25%** · Front en curso · Back en curso	Dev02 · Dev03 · Dev04	Revisión del teléfono en listas de riesgo integrada (29 oct); ajustes de front en curso
HU_N4_003	Verificación del teléfono con código SMS	Cuenta Digital N4	Completada	**100%** · Completada	Dev02 · Dev03 · Dev04	Envío y validación del código SMS completados
HU_N4_004	Captura y validación de INE	Cuenta Digital N4	En progreso	**42%** · Front pendiente · Back en curso	Dev04	Conexión con Incode y lectura automática de la INE entregadas (1 oct)
HU_N4_005	Confirmación de datos del INE	Cuenta Digital N4	En progreso	**50%** · Front listo · Back en curso	Dev02	
HU_N4_006	Verificación de CURP ante RENAPO	Cuenta Digital N4	Refinada, por iniciar	—		
HU_N4_007	Validación biométrica (selfie y prueba de vida)	Cuenta Digital N4	Refinada, por iniciar	—		
HU_N4_008	Confirmación y actualización de domicilio	Cuenta Digital N4	En progreso	**50%** · Front listo · Back en curso	Dev02	Front terminado; back en curso
HU_N4_009	Información fiscal y listas negras	Cuenta Digital N4	Por refinar	—		Pantalla fiscal ya construida
HU_N4_010	Información laboral	Cuenta Digital N4	En backlog	—		
HU0018	Información financiera y uso de la cuenta	Cuenta Digital N4	En backlog	—		Pantalla de cuestionario ya construida
HU_N4_10	Cuestionario de vulnerabilidad	Cuenta Digital N4	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev04	
HU0020	Documentos de contratación y correo	Cuenta Digital N4	En progreso	**50%** · Front listo · Back en curso	Dev02 · Dev05	Flujo cliente nuevo: documentos y firma
HU0021	Elegibilidad regulatoria y unicidad de cuenta	Cuenta Digital N4	En backlog	—		
HU0022	Firma del contrato de apertura	Cuenta Digital N4	En backlog	—		Componente de firma ya adaptado a N4

HU	Nombre	Épica	Etapa	Avance	Equipo	Comentario
HU0023	Creación de contraseña y confirmación	Cuenta Digital N4	En backlog	—		Pantallas ya construidas
HU0024	Landing: información general y requisitos	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev02 · Dev03	
HU0025	Datos de contacto / identificación cliente	Rocket	En progreso	**25%** · Front en curso · Back en curso	Dev05	Revisión del teléfono en listas de riesgo integrada (29 oct)
HU0026	Código de confirmación	Rocket	Refinada, por iniciar	—	Dev04	
HU0027	Instrucciones INE anverso/reverso	Rocket	Refinada, por iniciar	—	Dev02 · Dev04	
HU0028	Validación identidad adulto	Rocket	En progreso	**0%** · Front pendiente · Back pendiente		Arrancó con el back de biometría
HU0029	Confirmación datos adulto (extracción INE)	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev02 · Dev04 · Dev05	
HU0030	Confirmación y actualización de domicilio	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev02	
HU0031	Ocupación laboral	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0032	Origen de recursos	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0033	Uso de la cuenta	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0034	Uso de los recursos	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0035	Cargo en el gobierno (PEP)	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0036	Saldo promedio de depósito	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0037	Cuestionario de vulnerabilidad	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0038	Acta de nacimiento del menor	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back en curso	Dev05	Front terminado el 14 oct
HU0039	Si es cliente: documentación y código SMS	Rocket	Refinada, por iniciar	—	Dev02	
HU0040	No es cliente: documentación y firma	Rocket	En progreso	**50%** · Front listo · Back pendiente	Dev05	
HU0041	Generación de firma	Rocket	Refinada, por iniciar	—		Nueva HU, refinada

HU	Nombre	Épica	Etapa	Avance	Equipo	Comentario
HU0042	Generación de contraseña	Rocket	Refinada, por iniciar	—		Nueva HU, refinada
—	Mapeo de expediente y envío a backoffice	Rocket	En backlog	—		
HU0043	Home de la cuenta Rocket	Manejo cuenta Rocket	Completada	**100%** · Completada	Dev02 · Dev05	Completada el 26 oct
HU0044	Generación de accesos a la consola desde la app	Manejo cuenta Rocket	Completada	**100%** · Completada	Dev02 · Dev05	Completada el 26 oct
HU0045	Consulta de “Mi Tripulación” y administración de accesos	Manejo cuenta Rocket	Completada	**100%** · Completada	Dev02 · Dev05	Completada el 26 oct
—	Fondeo a la cuenta	Manejo cuenta Rocket	En backlog	—		
—	Inversiones	Manejo cuenta Rocket	En backlog	—		
—	Visualización estado de cuenta	Manejo cuenta Rocket	En backlog	—		
HU0046	Activación de cuenta del menor con enlace de acceso	Consola Rocket	En progreso	**0%** · Front pendiente · Back pendiente		Arrancó en el Sprint 4
HU0047	Activación de cuenta del menor con código de acceso	Consola Rocket	En progreso	**0%** · Front pendiente · Back pendiente		Arrancó en el Sprint 4
HU0048	Inicio de sesión en la consola	Consola Rocket	Refinada, por iniciar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0049	Recuperación de contraseña en la consola	Consola Rocket	Refinada, por iniciar	—		Nueva HU en ClickUp
—	Consola Rocket: reglas generales	Consola Rocket	En backlog	—		
HU-T01	Contratos API-First y mocks (BFF)	Cimentación técnica	Por refinar	—		
HU-T02	Scaffolding, CI/CD y calidad de código	Cimentación técnica	Por refinar	—		
HU-T03	PoC capa anticorrupción (SOAP→JSON)	Cimentación técnica	Por refinar	—		
HU-T04	Scaffolding app móvil y performance	Cimentación técnica	Por refinar	—		

HU	Nombre	Épica	Etapa	Avance	Equipo	Comentario
HU-T05	Seguridad base (IdP / API Gateway)	Cimentación técnica	Por refinar	—		
—	Naves de ahorro: edición	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
—	Naves de ahorro: detalle	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
—	Naves de ahorro: vista general	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
—	Aviso al adulto por nave creada desde la consola	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
—	Aviso de nave creada desde la consola	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
—	Naves de ahorro: creación	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
—	Naves de ahorro: introducción	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0091-1	Mensajes de la pantalla de carga	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0054	Consulta y actualización del perfil	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0053	Consulta y filtrado de movimientos	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0052	Detalle de la cuenta Rocket	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0051	Menú lateral de Rocket	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0112	Mapeo de errores	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0111	Actualización de contraseña	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0110	Perfil, configuración y cierre de sesión	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0109	Notificaciones	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0100	Eliminar misiones	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp

HU	Nombre	Épica	Etapa	Avance	Equipo	Comentario
HU0099	Editar misiones	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0098	Crear misiones	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0105	Misiones	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0104	Eliminar nave de ahorro	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0103	Editar nave de ahorro	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0094	Crear nave de ahorro	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0101	Nave de ahorro	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0103	Inversiones	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0103	Diseño de la tarjeta	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0102	Perfil, configuración y cierre de sesión	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0101	Notificaciones	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0097	Misiones	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0096	Eliminar nave de ahorro	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0095	Editar nave de ahorro	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0093	Naves de ahorro	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0092	Home de la consola	Consola Rocket	Refinada, por iniciar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0091	Pantalla de carga de la consola	Consola Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp
HU0050	Home para clientes sin tarjeta de débito	Manejo cuenta Rocket	Por refinar	—		Nueva HU en ClickUp

Fuentes: Master Gantt 360° y roadmap de Ikitech (19 de octubre de 2026), ClickUp del espacio CSB-Ikitech y backlog de épicas de la Nueva App Inversiones (3 de noviembre de 2026). El avance por HU pondera front 50% y back 50%. Product Owner: Martín Nieto.
